



“乡村振兴”预算股项目

绩效评价报告

鲁舜绩评字（2024）第 3701017 号

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年 12 月

“乡村振兴”预算股项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：“乡村振兴”预算股项目		
实施单位：枣庄市市中区农业农村局（以下简称“市中区农业局”） 枣庄市市中区排水事务中心（以下简称“市中区排水事务中心”） 枣庄市市中区城乡水务局（以下简称“市中区城乡水务局”）		
预算安排（万元）	251.58 万元	
其中：	中央财政补助资金	251.58 万元
实际到位（万元）	251.58 万元	
实际支出（万元）	251.58 万元（预算执行率为 100.00%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>1. 总体目标</p> <p>通过建设美丽家园、美丽移民村、实施水生态治理、道路硬化以及饮水安全提升改造等工程改善村民生活环境、提升生活质量、促进社会和谐与可持续发展。</p> <p>2. 具体目标</p> <p>计划建设 3 个美丽移民村—东南村、西街村和峨山口村；以及完成 10 个美丽家园项目，具体涉及前小湾村的排涝治理、后小湾村、孟庄村与杨楼村的道路硬化、宋楼村、纪官庄村和东花沟村的美丽家园建设、中义和村的水生态治理、荆山口村和沈桥村的饮水安全改造。此外，还利用了移民直补结余资金来建设东龙头社区的美丽家园项目。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>建设美丽家园完成情况、建成美丽移民村完成情况、项目验收合格情况、项目完成及时情况、项目成本控制情况。</p>		
三、主要问题及有关建议		

（一）主要问题

1. 通过查看被评价单位提供的绩效目标申报表，该项目缺少年度目标及可持续发展影响指标，绩效目标管理有待加强。

2. 项目前期枣庄市水利勘测设计院针对 13 个项目分别编制了实施方案，计划 2022 年 10 月开工，2022 年 12 月竣工，工期 3 个月。但项目实施未严格按照计划及时完成，实际开工时间延迟 1 个月，竣工时间延迟 3 个月，进度控制情况一般，制度执行有效性有待提高。

3. 项目实施方案编制不够严谨，出现与实施方案、承包合同及工程验收鉴定书等实施周期不一致情况。

三个标段合同签订实施周期均为 2022 年 10 月 22 日-2022 年 12 月 21 日；

实施方案中宋楼村美丽家园项目填写的日期为 2021 年 10 月-2021 年 12 月；
峨山口美丽移民村项目填写的日期为 2021 年 10 月-2021 年 12 月；

实际开工日期为 2022 年 11 月 11 日，竣工日期一标段为 2023 年 3 月 30 日，二标段为 2023 年 3 月 25 日，三标段为 2023 年 3 月 26 日。

4、项目整体预算额度过高。

根据区财政局提供的预算股项目明细表及查阅项目有关档案，2024 年度“乡村振兴”预算股项目整体预算为 6000 万元，当年度已分配金额为 4,038.86 万元，占整体预算的 67.31%；实际支出金额 268.58 万元，占整体预算的 4.48%，已分配及实际支出金额相较预算金额差异较大，预算额度金额标准制定过高

（二）相关建议

1. 加强绩效目标管理，细化年度目标设置

在现有的总体目标基础上，进一步细分出具体的年度目标，同时绩效目标应具备可衡量性、可达成性和相关性，以便在项目推进过程中能够准确判断目标的完成情况。

2. 优化项目进度控制，提升制度执行有效性

建议项目单位严格按照实施方案进行项目管理和资源调配，确保项目能够按时开工和竣工。对于出现的延期情况，应及时分析原因并采取补救措施。同时，加强项目进度的监控，建立有效的进度控制机制，如定期召开项目进度会议等，以确保项目能够按计划顺利进行。

3. 规范编制实施方案，确保文件一致性

加强实施方案审核流程，由专人负责审查，务必仔细核对合同条款和其他相关文件，确保方案内容准确无误，特别是涉及到的时间节点、施工范围等关键信息。

4. 建议下调下年度项目整体预算金额。

2024 年度“乡村振兴”预算股项目整体预算金额为 6000 万元，但当年度已分配仅为 4,038.86 万元，分配率为 67.31%，且实际支出金额更低。根据目前项目现状及实际情况，建议 2025 年度“乡村振兴”预算股项目整体预算金额为 4,000.00 万元左右，通过压缩整体项目预算，将节约的财政预算资金运用到其他应急项目中。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	19	95
过程	25	23	92
产出	25	22	88
效益	30	21	70
合计	100	85	85

绩效评价得分：85 分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象和范围	4
(三) 评价指标体系	4
(四) 评价方法	4
(五) 绩效评价标准	4
三、评价结论及分析	5
(一) 综合评价结论	5
(二) 指标分析	6
1. 决策指标分析	6
2. 过程指标分析	9
3. 产出指标分析	11
4. 效益指标分析	15
四、发现的问题	17
五、相关建议	19
六、其他需要说明的问题	20

“乡村振兴”预算股项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

该项目紧密围绕习近平总书记提出的“以人民为中心的发展思想”，通过加强基础设施建设、改善生产生活条件和推进生态环境治理，切实提升移民的幸福感和获得感。同时，项目积极响应乡村振兴战略要求，以美丽乡村建设为抓手，推动农村人居环境改善，促进区域社会经济的全面协调发展。枣庄市市中区城乡水务局为落实国家关于移民扶持政策的重要举措，也是为践行乡村振兴战略、推动共同富裕的具体实践，根据《山东省水利厅关于做好 2022 年中央水库移民扶持基金(清算)使用工作的通知》(鲁水移民函字〔2022〕19 号)及枣庄市城乡水务局枣水建字〔2022〕25 号等文件实施了该项目。

2. 项目主要内容

本项目由市中区农业局、市中区排水事务中心、市中区城乡水务局作为实施单位，共同实施乡村振兴有关项目。其中市中区农业局负责实施 3 个子项目，市中区排水事务中心负责实施 1 个子项目，市中区城乡水务局负责实施 1 个子项目。各子项目详细情况详见下表：

**表1 “乡村振兴”预算股项目
预算总额及各子项目预算分配金额明细表**

金额单位：万元

项目名称	预算总额	实施单位	序号	子项目名称	预算分配金额	
乡村振兴	6,000.00	市中区农业局	1	市级现代农业产业园	6.00	
			2	发展小麦种业资金	11.00	
			3	第三次土壤普查	220.28	
				小计		237.28
		市中区排水事务中心	污水处理设施运营维护		3,550.00	
		市中区城乡税务局	2022年中央水库移民后期扶持基金项目		251.58	
		总计				4,038.86

注：“乡村振兴”预算股项目中，市级现代农业产业园、发展小麦种业资金、第三次土壤普查、污水处理设施运营维护4个子项目，经与区财政局沟通并结合项目实际情况，以上4个子项目不纳入本次绩效评价范围。

3. 项目实施情况

该项目为中央财政补助资金支持的建设项目，总预算为1100万元人民币，并分为三个标段实施。项目主要包括建设3个美丽移民村—东南村、西街村和峨山口村；以及完成10个美丽家园项目，具体涉及前小湾村的排涝治理、后小湾村、孟庄村与杨楼村的道路硬化、宋楼村、纪官庄村和东花沟村的美丽家园建设、中义和村的水生态治理、荆山口村和沈桥村的饮水安全改造。此外，还利用了移民直补结余资金来建设

东龙头社区的美丽家园项目。目前，所有建设内容均已全部完成，并且已经通过了验收。

4. 资金投入及使用情况

截至评价报告日，项目当年实际到位资金 251.58 万元，已使用资金 251.58 万元，资金预算执行率 100.00%。

注：该项目总预算资金为 1100 万元，全部来源于中央财政补助，本次评价资金为 2024 年预算分配金额 251.58 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过建设美丽家园、美丽移民村、实施水生态治理、道路硬化以及饮水安全提升改造等工程改善村民生活环境、提升生活质量、促进社会和谐与可持续发展。

2. 具体目标

计划建设 3 个美丽移民村—东南村、西街村和峨山口村；以及完成 10 个美丽家园项目，具体涉及前小湾村的排涝治理、后小湾村、孟庄村与杨楼村的道路硬化、宋楼村、纪官庄村和东花沟村的美丽家园建设、中义和村的水生态治理、荆山口村和沈桥村的饮水安全改造。此外，还利用了移民直补结余资金来建设东龙头社区的美丽家园项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为进一步加强和改进预算管理，更好地发挥财政资金效益，

通过全面了解“乡村振兴”预算股项目财政资金的资金分配情况、资金实际执行情况，评价资金分配的合理性、资金使用的必要性、使用效果以及预期目标的实现程度，发现并分析项目在资金管理和项目管理中存在的问题，提出有针对性的建议，为进一步提高资金使用效率和效益、提高项目管理水平提供相应建议。

（二）评价对象和范围

评价对象为“乡村振兴”预算股项目资金使用情况；评价范围为“乡村振兴”项目开展情况和项目的数量、质量、时效、成本等绩效目标的实现情况。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益十个二级指标、二十个三级指标。

（四）评价方法

本次评价严格遵循科学规范、公开公正原则，从多层面多维度进行综合分析，主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法和公众评判法等方法，以现场评价的方式进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

（五）绩效评价标准

本次绩效评价级次分为 4 个等级：综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”，其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。


三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 85.00 分，评价结果为“良”。其中：项目决策类指标权重为 20 分，得分为 19 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 23 分；项目产出类指标权重为 25 分，得分为 22 分；项目效益类指标权重为 30 分，得分为 21 分。

表 2 “乡村振兴”预算股项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率%
决策	20	19	95
过程	25	23	92
产出	25	22	88
效益	30	21	70
合计	100	85	85

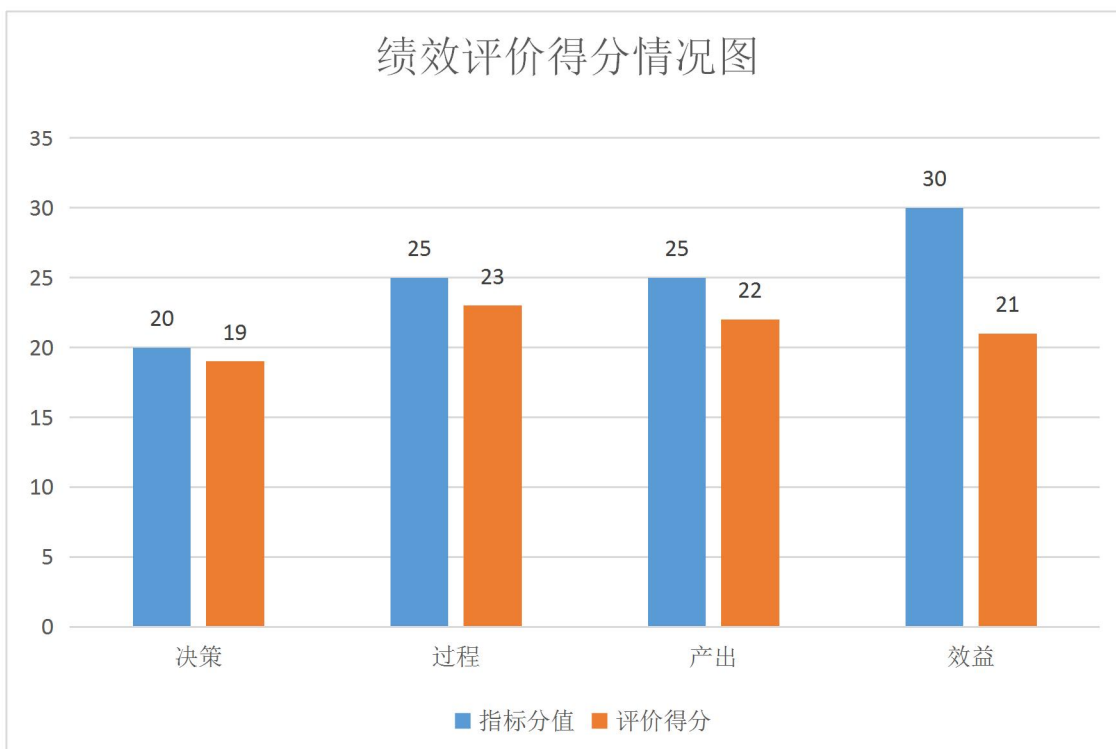


(二) 指标分析

1. 决策指标分析

表 3 决策类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入(8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计			20	19

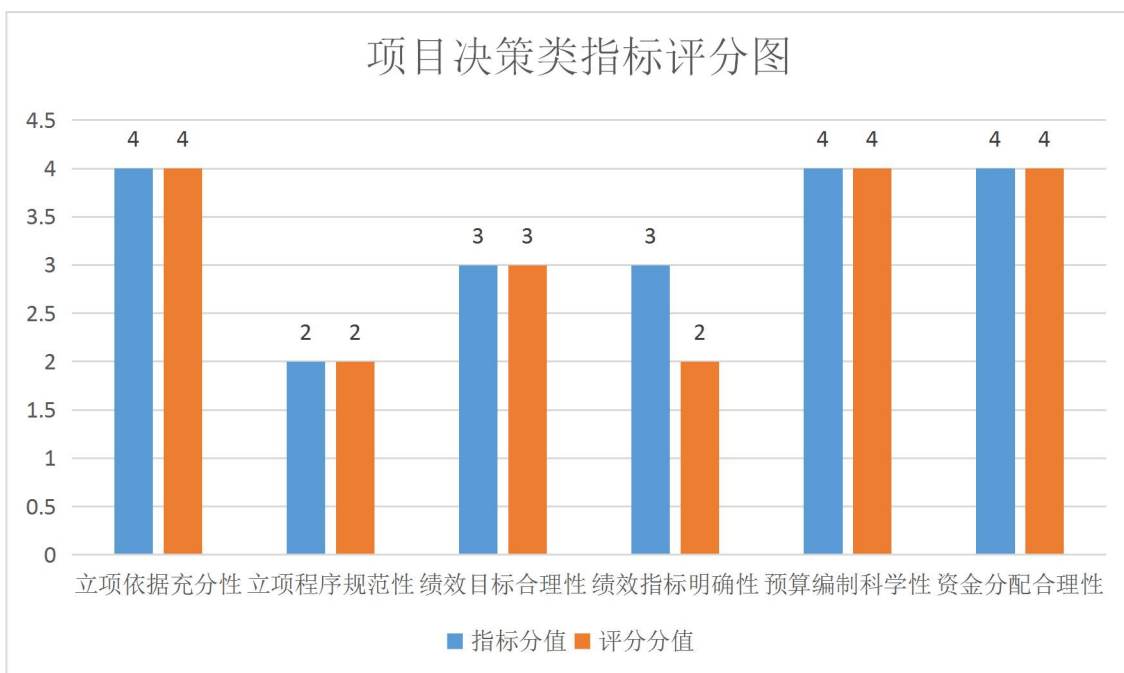

(1) 项目立项

① 立项依据充分性

市中区城乡水务局根据《山东省水利厅关于做好 2022 年中央水库移民扶持基金(清算)使用工作的通知》(鲁水移民函字〔2022〕19 号)及枣庄市城乡水务局枣水建字〔2022〕25 号,组织实施了本项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,与单位职责范围相符,属于公共财政支持范围,且不与同类或相关项目重复。

此项分值 4.00 分,评价得分为 4.00 分。

② 立项程序规范性

市中区城乡水务局于 2022 年 8 月 10 日提交《关于市中区 2022 年水库移民扶持基金(清算)项目计划的请示》(市中水字〔2022〕60 号),2022 年 8 月 12 日经枣庄市城乡水务局批复《关于下达中央水库移民后期扶持基金(清算)项目计划

的通知》枣水建字〔2022〕28号，立项程序合法、合规。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性

根据评价小组收集的相关资料显示，被评价单位提供了 2022 年中央水库移民后期扶持基金目标申报表，项目整体绩效目标预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与实际工作内容相关性较强，与预算确定的项目投资额相匹配。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

②绩效指标明确性

根据评价小组收集的相关资料显示，本项目绩效目标申报表分别从产出、效益及满意度指标等几个方面设定，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划。项目绩效目标与项目实施单位即市中区城乡水务局的职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，但缺少年度目标及可持续影响指标，根据评分标准，此项扣 1.00 分。

此项分值 3.00 分，评价得分为 2.00 分。

（3）资金投入

①预算编制科学性

本项目以项目合同协议书中约定的金额为依据进行预算资金申请，预算内容与项目内容相匹配，预算编制有明确标准，资金额度与工作任务相匹配，预算编制科学合理。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分

② 资金分配合理性

本项目按照签订的合同协议书或第三方专业机构审定后的工程造价结果进行测算，资金分配依据充分，分配额度合理，与项目需求相适应。


此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

2. 过程指标分析

表 4 过程类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程 (25 分)	资金管理 (13 分)	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	6
合 计			25	23

项目过程类指标评分图

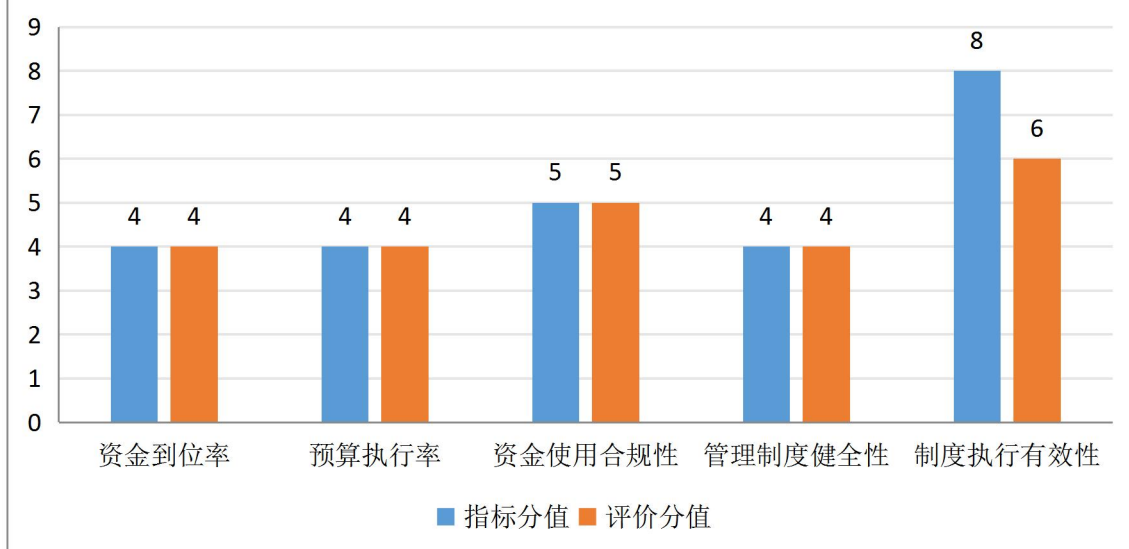

（1）资金管理

①资金到位率

根据《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕31 号）及《关于市中区 2022 年水库移民扶持基金（清算）项目实施方案的批复》（市中水字〔2022〕76 号）等资料显示，本次绩效评价项目财政预算资金共计 1100 万元，其中 2024 年预算分配金额 251.58 万元，实际资金到位 251.58 万元，资金到位率为 100.00%。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

②预算执行率

根据评价小组收集项目相关的支出明细账、记账凭证及原始凭证等财务资料显示，该项目资金 2024 年度实际到位 251.58 万元，实际支出 251.58 万元，预算执行率为 100.00%。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

③资金使用合规性

根据评价小组收集项目相关的支出明细账、记账凭证及原始凭证等财务资料显示，资金已按要求拨付至枣庄市水利开发公司，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此外，该项目严格遵守规定，实施了政府采购和政府购买服务。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

(2) 组织实施

① 管理制度健全性

根据评价小组收集相关资料显示,枣庄市市中区城乡水务局根据实际需要,制定了《安全生产管理规章制度》《质量验收管理制度》《财务管理办法》《质量检查制度》《资金监督检查办法》等多项内部管理制度,制度健全完善,能够对项目的顺利实施提供有效保障。

此项分值 4.00 分,评价得分为 4.00 分。

② 制度执行有效性

经评价小组查阅项目有关管理办法、制度等资料显示,项目在实施过程中遵守了相关法律法规和管理规定,并制定了《质量管理规章制度》《质量检查制度》及《验收制度》等一系列管理制度,确保了管理措施的有效执行。同时,项目的档案资料完整且及时归档。虽然枣庄市水利勘测设计院为 13 个项目分别编制了详细的实施方案,但实际执行中未能严格按照计划推进,导致所有项目的竣工时间均延迟了 3 个月,进度控制情况一般。根据评分标准,此项扣 2.00 分。


此项分值 8.00 分,评价得分为 6.00 分。

3. 产出指标分析

表 5 产出类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	建设美丽家园完成情况	5	5
		建成美丽移民村完成情况	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出质量 (5分)	项目验收合格情况	5	5
	产出时效 (5分)	项目完成及时情况	5	2
	产出成本 (5分)	成本控制情况	5	5
合 计			25	22

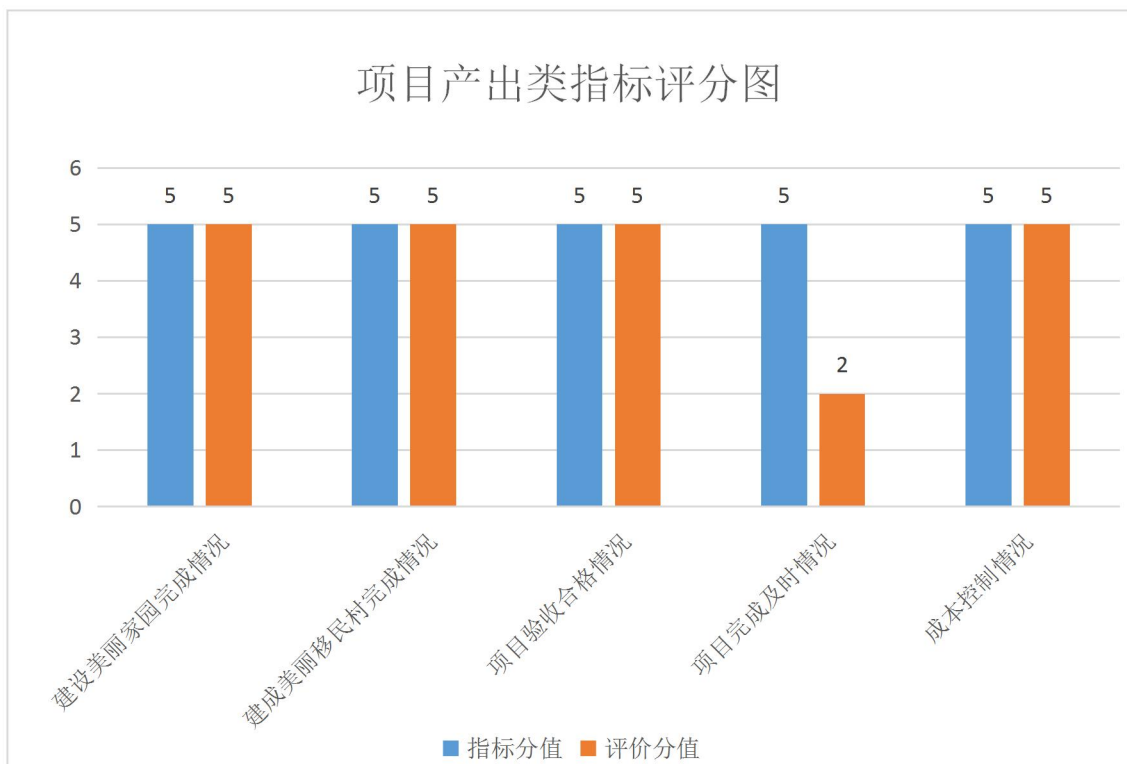

(1) 项目产出

①建设美丽家园完成情况

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料显示，本次项目计划建设10个美丽家园项目和利用移民直补结余资金建设东龙头社区美丽家园项目。目前，所有建设内容均已全部完成。具体明细如下：

表 6 美丽家园完成情况明细表

实施单位	序号	项目名称	备注
美丽家园	1	西王庄镇东花沟村美丽家园项目	
	2	孟庄镇后孟庄村道路硬化项目	
	3	西王庄镇后小湾村道路硬化项目	
	4	税郭镇纪官庄村美丽家园项目	
	5	孟庄镇荆山口村饮水安全改造项目	
	6	西王庄镇前小湾村排涝治理项目	
	7	孟庄镇沈桥村饮水安全改造项目	
	8	西王庄镇宋楼村美丽家园项目	
	9	西王庄镇杨楼村道路硬化项目	
	10	税郭镇中义和村水生态治理项目	
	11	东龙头社区美丽家园项目	移民直补结余资金

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

②建成美丽移民村完成情况

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料显示，本次项目计划建设 3 个美丽移民村，目前，所有建设内容均已全部完成。具体明细如下：

表 7 美丽移民村情况统计明细表

实施单位	序号	项目名称	备注
美丽移民村	1	西王庄镇西街村美丽移民村项目	
	2	税郭镇东南村美丽移民村项目	
	3	孟庄镇峨山口美丽移民村项目	

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

(2) 产出质量

①项目验收合格情况

根据评价小组查阅的项目资料,该项目在三个标段完工后,由监理单位主持,联合项目法人、施工单位、质量和安全监督机构等进行了初步验收,确保了工程符合规定要求。初步验收合格后,于2023年3月31日,在枣庄市市中区城乡水务局的主持下,项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、检测单位、质量监督单位及运行管理单位等多方共同参与,对项目及合同工程进行了最终验收,并顺利通过,确认了项目的整体质量和合规性。

此项分值5.00分,评价得分为5.00分。

(3) 产出时效

①项目完成及时情况

根据评价小组查阅该项目实施方案、承包合同及工程验收鉴定书等资料发现,项目实施周期存在不一致情况,具体如下:

三个标段合同签订实施周期均为2022年10月22月-2022年12月21日;

实施方案中宋楼村美丽家园项目填写的日期为2021年10月-2021年12月;峨山口美丽移民村项目填写的日期为2021年10月-2021年12月;

实际开工日期为2022年11月11日,竣工日期一标段为2023年3月30日,二标段为2023年3月25日,三标段为2023年3月26日;根据评分标准,此项扣3.00分。

此项分值5.00分,评价得分为2.00分。

(4) 产出成本

①项目成本控制情况

根据评价小组查阅的项目资料，三个标段的中标总价格为 9,936,935.42 元，而实际最终决算价格为 9,692,077.31 元。项目在实施过程中有效控制了成本，最终决算价格较中标价格降低了 244,858.11 元，显示出良好的成本管理成效。具体明细如下：

**表 8 2022 年中央水库移民后期扶持基金项目
工程造价计算表**


分项工程	中标金额（元）	实际金额（元）
一标段	3,696,966.96	3,713,756.11
二标段	3,252,668.18	3,162,569.30
三标段	2,987,300.28	2,815,751.90
合 计	9,936,935.42	9,692,077.31

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

4. 效益指标分析

表 9 项目效益类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益	12	12
		生态效益	6	3
		可持续影响	6	3
		满意程度	6	3
合 计			30	21

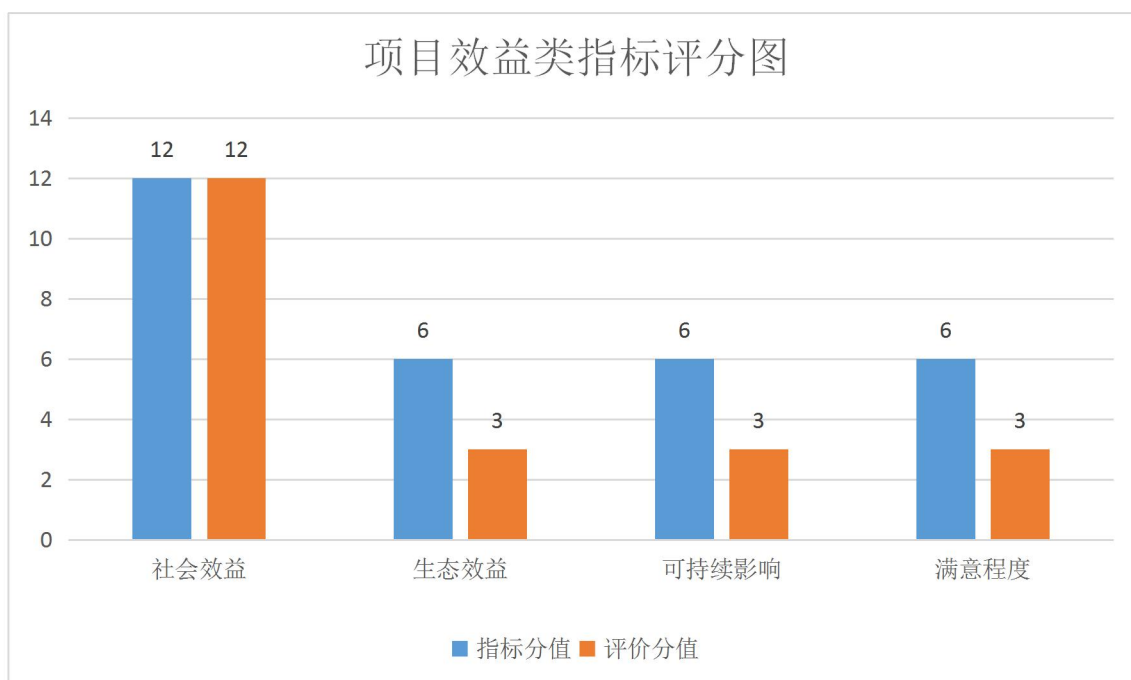

①社会效益

A. 通过评价小组深入项目现场并走访附近居民进行问卷调查后发现，该项目通过建设包括文化广场、篮球场、乒乓球台等在内的基础设施，为移民安置区提供了丰富的文化、娱乐和休闲场所，极大地充实了居民的业余生活，提升了社区的生活质量和居民的幸福感。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

B. 通过评价小组深入项目现场并走访附近居民进行问卷调查后发现，该项目通过实施道路硬化和排水设施建设等工程，显著改善了村民的出行和排水状况，使交通更加顺畅，排水更为通畅。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

②生态效益

该项目通过建设广场、公园、绿化、排水系统改造及道路硬化等工程的实施，旨在有效丰富和改善附近村民的生活环境，然而，根据评价小组深入项目现场、走访附近居民并进行问卷调查后所收集到的资料显示，这些措施在实际提升村民居住环境质量方面未达到预期效果。根据评分标准，此项扣 3.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 3.00 分。

③可持续影响

该项目通过实施道路硬化、排水系统改造、饮用水管网铺设以及建设文化广场和公园等设施，具备了长期的使用价值和改善居民生活质量的潜力。然而，根据评价小组深入项目现场、走访附近居民并进行问卷调查后所收集的反馈显示，存在一些后期维护管理不到位的问题，如文化广场及河道垃圾未得到及时清理、健身器材周围杂草丛生、阅读室尚未开放以及桥上台阶部分损毁等，根据评分标准，此项扣 3.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 3.00 分。

④满意程度

为了评价受益群众对本项目的满意程度，评价小组随机抽取两个受益村庄的村民进行问卷调查，评价小组共发放 25 份调查问卷，实际收回有效问卷 25 份，经统计周边居民对本项目的满意度为 81.16%，根据评分标准，此项扣 3 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 3.00 分。

四、发现的问题

(一)通过查看被评价单位提供的绩效目标申报表,该项目缺少年度目标及可持续影响指标,绩效目标管理有待加强。

(二)项目前期枣庄市水利勘测设计院针对13个项目分别编制了实施方案,计划2022年10月开工,2022年12月竣工,工期3个月。但项目实施未严格按照计划及时完成,实际开工时间延迟1个月,竣工时间延迟3个月,进度控制情况一般,制度执行有效性有待提高。

(三)项目实施方案编制不够严谨,出现与实施方案、承包合同及工程验收鉴定书等实施周期不一致情况。

三个标段合同签订实施周期均为2022年10月22日-2022年12月21日;

实施方案中宋楼村美丽家园项目填写的日期为2021年10月-2021年12月;峨山口美丽移民村项目填写的日期为2021年10月-2021年12月;

实际开工日期为2022年11月11日,竣工日期一标段为2023年3月30日,二标段为2023年3月25日,三标段为2023年3月26日。

(四)项目整体预算额度过高。

根据区财政局提供的预算股项目明细表及查阅项目有关档案,2024年度“乡村振兴”预算股项目整体预算为6000万元,当年度已分配金额为4,038.86万元,占整体预算的67.31%;实际支出金额268.58万元,占整体预算的4.48%,已分配及实际支出金额较预算金额差异较大,预算额度金额标准制定过

高。

五、相关建议

（一）加强绩效目标管理，细化年度目标设置

在现有的总体目标基础上，进一步细化具体的年度目标，同时绩效目标应具备可衡量性、可达成性和相关性，以便在项目推进过程中能够准确判断目标的完成情况。

（二）优化项目进度控制，提升制度执行有效性

建议项目单位严格按照实施方案进行项目管理和资源调配，确保项目能够按时开工和竣工。对于出现的延期情况，应及时分析原因并采取补救措施。同时，加强项目进度的监控，建立有效的进度控制机制，如定期召开项目进度会议等，以确保项目能够按计划顺利进行。

（三）规范编制实施方案，确保文件一致性

加强实施方案审核流程，由专人负责审查，务必仔细核对合同条款和其他相关文件，确保方案内容准确无误，特别是涉及到的时间节点、施工范围等关键信息。

（四）建议下调下年度项目整体预算金额。

2024年度“乡村振兴”预算股项目整体预算金额为6000万元，但当年度已分配仅为4,038.86万元，分配率为67.31%，且实际支出金额更低。根据目前项目现状及实际情况，建议2025年度“乡村振兴”预算股项目整体预算金额为4,000.00万元左右，通过压缩整体项目预算，将节约的财政预算资金运用到其他应急项目中去。

六、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价小组成员、相关专家执业水平限制和被调查对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

附件：

1. “乡村振兴”预算股项目绩效评价指标体系及得分表
2. 满意度分析报告
3. 项目相关文件、制度
4. 项目现场调查照片
5. 其他

(此页无正文)

山东舜天信诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



二〇二四年十二月三十一日

附件1:

“乡村振兴”预算股项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合支出责任划分原则; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分说明:以上要素各占 1/4 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。 评分说明:以上要素各占 1/2 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	2.00	100.00%	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	评价要点: ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ②项目预期产出效益和效果是否符合目标要求; ③是否与预算确定的资金量相匹配。 评分说明: 以上要素各占 1/3 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	3.00	100.00%	
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数相对应。 评分说明: 以上要素各占 1/3 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	2.00	66.67%	缺少年度目标及可持续影响指标

附件1:

“乡村振兴”预算股项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分说明： 以上要素各占 1/4 权重分，每发现一项不符合的，扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与相关或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分说明： 以上要素各占 1/2 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
	资金管理 (13分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分方法： 得分=资金到位率×指标分值，最高得分4分。	4.00	100.00%	
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分方法： 得分=预算到位率×指标分值，最高得分4分。	4.00	100.00%	

附件1:

“乡村振兴”预算股项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
过程 (25分)	组织实施 (12分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否按规定实施政府采购和政府购买服务; 评分方法: 以上①②两项各占1/2权重分,③为1分,若有一项不满足,则扣除相应权重分。	5.00	100.00%	
		管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分方法: 2项各占1/2权重分,若有一项不满足,则扣除相应权重分。	4.00	100.00%	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目档案资料是否齐全并及时归档; ④项目是否制定或具有相应的项目质量要求或标准; ⑤项目实施与实施方案或计划是否相符,项目实施的进度控制情况是否较好; ⑥项目单位是否采取了相应的项目质量检查、验收等措施,对项目质量检查、验收等的管理是够控制情况较好; 评分方法: 以上①②③④为1分,⑤⑥各2分,每发现一项不符合,扣除相应分	6.00	75.00%	项目计划2022年10月22日开工,2022年12月21日竣工,实际开工日期为2022年11月11日,竣工日期一标段为2023年3月30日,二标段为2023年3月25日,三标段为2023年3月26日。
产出数量		建设美丽家园完成情况 (5分)	实际完成值是否达到预期数量	评价要点: 是否按照预期工程量完成 评分方法: 得分=实际完成数量/计划数量*100%*5分。	5.00	100.00%	

附件1:

“乡村振兴”预算股项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
产出 (25分)	(10分)	建成美丽移民村完成情况 (5分)	实际完成值是否达到预期数量	评价要点: 是否按照预期工程量完成 评分方法: 得分=实际完成数量/计划数量*100%*5分。	5.00	100.00%	
	产出质量 (5分)	项目验收合格情况 (5分)	对宏利采石场破损山体矿山地质环境治理工程项目验收合格情况进行评价。	评价要点: 项目验收是否合格 评分方法: 验收合格得5分, 否则酌情扣分。	5.00	100.00%	
	产出时效 (5分)	项目完成及时情况 (5分)	项目完成时效是否满足实施方案要求, 是否严格按照项目任务规定时间完成。	评价要点: 项目是否按照计划及时完成。 评分方法: 按照计划及时完成得5分, 否则酌情扣分。	2.00	40.00%	三个标段合同签订日期为2022年10月22日-2022年12月21日; 实施方案中宋楼村美丽家园项目填写的日期为2021年10月-2021年12月; 峨山口美丽移民村项目填写的日期为2021年10月-2021年12月; 实际开工日期为2022年11月11日, 竣工日期一标段为2023年3月30日, 二标段为2023年3月25日, 三标段为2023年3月26日;
	产出成本 (5分)	项目成本控制情况 (5分)	对项目成本是否超出计划进行评价。	评价要点: 是否按照预期成本执行。 评分方法: 每超出计划1%扣1分, 扣完为止	5.00	100.00%	
社会效益 (12分)			通过建设基础设施是否丰富了居民的业余生活, 提高生活质量。	该项分值6分。提高显著得6分, 提高一般得3分, 未提高不得分。	6.00	100.00%	
			通过建设基础设施是否对生活带来了便利	该项分值6分。效果显著得6分, 效果一般得3分, 效果较差得0分。	6.00	100.00%	

附件1:

“乡村振兴”预算股项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
效益 (30分)	项目效益 (30分)	生态效益 (6分)	通过该项目的建设是否改善了人均居住环境	该项分值6分。改善较为明显得6分，改善一般得3分，未改善不得分。	3.00	50.00%	根据评价小组深入项目现场、走访附近居民并进行问卷调查后所收集到的反馈显示，这些措施在实际提升人均居住环境质量方面的效果并未达到预期
		可持续影响 (6分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	该项分值6分。效果显著得6分，效果一般得3分，效果较差得0分。	3.00	50.00%	根据评价小组深入项目现场、走访附近居民并进行问卷调查后所收集的反馈显示，存在一些后期维护管理不到位的问题，如文化广场及河道垃圾未得到及时清理、健身器材周围杂草丛生、阅读室尚未开放以及桥上台阶部分损毁等
		满意程度 (6分)	服务对象对项目实施的满意度	该项分值6分。整体满意度95%以上为较高得6分；95%-80%（含80%）为一般得3分；80%以下为较低得0分。	3.00	50.00%	81.16%
合计					85.00		

附件：2-1

居民满意度调查问卷-峨山口村

您好！

为“乡村振兴”预算股项目提供数据支撑，评价组对受益对象满意度开展调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要2分钟，请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

年 月

基本信息：_____市_____镇_____村

1. 您是否为水库移民本人：

A. 是 B. 否

2. 您是否清楚关于移民村基础设施建设的的项目？

A. 完全了解 B. 比较了解
C. 知道一些 D. 完全不了解

3. 您通常多久去一次文化建设广场或公园？

A. 每天 B. 每周几次 C. 每月几次
D. 几个月一次 E. 从未去过

4. 您认为通过本项目建设的文化广场、公园等基础设施是否丰富了您的业余生活？

A. 非常丰富 B. 较丰富
C. 一般 D. 没有改善

5. 通过这些基础设施的建设，您在出行、用水、排水等方面的便利程度是否得到提高？

A. 提高很多 B. 有所提高

“乡村振兴”预算股项目 居民满意度调查问卷-峨山口村

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调查采用了问卷调查法，调查对象涵盖“乡村振兴”预算股项目中的受益群众。

（二）调研内容

针对的项目开展情况，从受益群体反馈等方面设计了相关问题，形成调查问卷。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

根据前期查阅部门整体资料，通过线上微信社交平台发放问卷二维码，线下座谈会和入户走访进行面对面的交谈，并结合电话访问的方式全面了解项目受益群体的满意程度及相关意见。

（二）抽样方式

根据提供的受益群众清单的样本分布，科学的进行多段随机抽样，保证最终执行样本的代表性，并保证抽查项目样本不少于统计学上最低统计样本量进行评价。

三、问卷的发放和回收



本次满意度调查采用线上、线下问卷发放及电话访问的方式调查受益群众的满意度，收集受益群众对被评价项目的意见和建议。同时，我们在被访问人员填写问卷时将对问卷的填写

时间进行监控，问卷的填写时间快于经测算的标准时间 50%以上的，我们将采取作废处理。不同方式收集的问卷信息也进行相互验证，确保问卷信息的全面性和可信度。共收集调查问卷 13 份，其中有效问卷 13 份，经汇总统计““乡村振兴”预算股项目受益群众满意度为 75.64%。

四、满意度分析




1. 关于您是否为水库移民本人？结果如下：

关于您是否为水库移民本人的调查情况，其中：是的为 0 人，占比 0%；否的为 13 人，占比 100%。

选项	小计	比例
A.是	0	 0%
B.否	13	 100%
本题有效填写人次	13	

2. 您是否清楚关于移民村基础设施建设的的项目？调查结果如下：

关于您是否清楚关于移民村基础设施建设的的项目调查情况，其中：完全了解的为 2 人，占比 15.38%；比较了解的为 6 人，占比 46.15%；知道一些的为 3 人，占比 23.08%；完全不了解的为 2 人，占比 15.38%。

选项	小计	比例
A.完全了解	2	 15.38%
B.比较了解	6	 46.15%
C.知道一些	3	 23.08%
D.完全不了解	2	 15.38%

本题有效填写人次	13
----------	----

3. 您通常多久去一次文化建设广场或公园？调查结果如下：

关于您通常多久去一次文化建设广场或公园的调查情况，其中：每天的1人，占比15.38%；每周几次的6人，占比46.15%；每月几次的3人，占比23.08%；几个月一次的2人，占比15.38%；从未去过的0人，占比0%。

选项	小计	比例
A.每天	2	 15.38%
B.每周几次	6	 46.15%
C.每月几次	3	 23.08%
D.几个月一次	2	 15.38%
E.从未去过	0	 0%
本题有效填写人次	13	

4. 您认为通过本项目建设的文化广场、公园等基础设施是否丰富了您的业余生活？调查结果如下：

关于您认为通过本项目建设的文化广场、公园等基础设施是否丰富了您的业余生活的调查情况，其中：非常丰富的2人，占比15.38%；较丰富的10人，占比76.92%；一般的2人，占比7.69%；没有改善的0人，占比0%。

选项	小计	比例
A.非常丰富	2	 15.38%
B.较丰富	10	 76.92%
C.一般	1	 7.69%
D.没有改善	0	 0%
本题有效填写人次	13	

5. 通过这些基础设施的建设，您在出行、用水、排水等方面的便利程度是否得到提高？调查结果如下：

关于通过这些基础设施的建设，您在出行、用水、排水等方面的便利程度是否得到提高的调查情况，其中：提高很多的 A 人，占比 23.08%；有所提高的 9 人，占比 69.23%；基本无变化的 1 人，占比 7.69%；变得更差的 0 人，占比 0%。

选项	小计	比例
A.提高很多	3	 23.08%
B.有所提高	9	 69.23%
C.基本无变化	1	 7.69%
D.变得更差	0	 0%
本题有效填写人次	13	

6. 通过本项目的建设，您认为您居住环境是否得到改善？调查结果如下：

关于通过本项目的建设，您认为您居住环境是否得到改善的调查情况，其中：改善显著的 2 人，占比 15.38%；有所改善的 8 人，占比 61.54%；无明显变化的 3 人，占比 23.08%；变得更差的 0 人，占比 0%。

选项	小计	比例
A.改善显著	2	 15.38%
B.有所改善	8	 61.54%
C.无明显变化	3	 23.08%
D.变得更差	0	 0%
本题有效填写人次	13	

7. 您认为项目建成后的设施是否具备长期使用价值和稳定

效果？调查结果如下：

关于您认为项目建成后的设施是否具备长期使用价值和稳定效果的调查情况，其中：完全具备的 1 人，占比 7.69%；基本具备的 9 人，占比 69.23%；不确定的 3 人，占比 23.08%；不具备的 0 人，占比 0%。

选项	小计	比例
A.完全具备	1	 7.69%
B.基本具备	9	 69.23%
C.不确定	3	 23.08%
D.不具备	0	 0%
本题有效填写人次	13	

8. 您对该项目基础设施的后期维护管理情况是否满意？调查结果如下：

关于您对该项目基础设施的后期维护管理情况是否满意的调查情况，其中：满意的 1 人，占比 7.69%；基本满意的 6 人，占比 46.15%；一般的 5 人，占比 38.46%；不满意的 1 人，占比 7.69%。

选项	小计	比例
A.满意	1	 7.69%
B.基本满意	6	 46.15%
C.一般	5	 38.46%
D.不满意	1	 7.69%
本题有效填写人次	13	

9. 您认为本项目还有哪些需要改进的地方？调查结果如下：

关于您认为本项目还有哪些需要改进的地方的调查情况，

其中：增加投入力度，扩大建设范围的 4 人，占比 30.77%；提高工程质量和建设进度的 4 人，占比 30.77%；增强项目透明度和移民参与度的 5 人，占比 38.46%；增加后期维护和管理力度的 9 人，占比 69.23%；其他的 2 人，占比 15.38%。

选项	小计	比例
A.增加投入力度，扩大建设范围	4	 30.77%
B.提高工程质量和建设进度	4	 30.77%
C.增强项目透明度和移民参与度	5	 38.46%
D.增加后期维护和管理力度	9	 69.23%
E.其他	2	 15.38%
本题有效填写人次	13	

10. 您对本项目建设的基础设施整体满意度如何？调查结果如下：

关于您对本项目建设的基础设施整体满意度如何的调查情况，其中：非常满意的 2 人，占比 15.38%；满意的 6 人，占比 46.15%；一般的 5 人，占比 38.46%；不满意的 0 人，占比 0%。

选项	小计	比例
A.非常满意	2	 15.38%
B.满意	6	 46.15%
C.一般	5	 38.46%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	13	

附件：2-2

“乡村振兴”预算股项目
居民满意度调查问卷-荆山口村

您好！

为“乡村振兴”预算股项目提供数据支撑，评价组对受益对象满意度开展调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要2分钟，请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

基本信息：_____市_____镇_____村

_____年 _____月

1. 您是否为水库移民本人：

A. 是 B. 否

2. 您是否清楚关于移民村基础设施建设的項目？

A. 完全了解 B. 比较了解
C. 知道一些 D. 完全不了解

3. 您对新铺设的供水的 PE 管道使用满意吗？

A. 非常满意 B. 满意
C. 一般 D. 不满意

4. 您是否遇到过因供水 PE 管道问题导致的断水或水质问题？

A. 经常遇到 B. 偶尔遇到 C. 从未遇到

5. 您对新建饮水水源的水质满意吗？

A. 非常满意 B. 满意
C. 一般 D. 不满意

6. 通过这些基础设施的建设，您在出行、用水等方面的便利程度是否得到提高？

- A. 提高很多
- B. 有所提高
- C. 基本无变化
- D. 变得更差

7. 您认为供水 PE 管道、新建饮水水源和混凝土道路建设对您的日常生活有何影响？（可多选）

- A. 居住环境更优美
- B. 交通更加便利
- C. 生活用水更安全
- D. 文化娱乐活动增加
- E. 没有明显变化
- F. 其他

8. 您认为项目建成后的设施是否具备长期使用价值和稳定效果？

- A. 完全具备
- B. 基本具备
- C. 不确定
- D. 不具备

9. 您认为供水 PE 管道、新建饮水水源和混凝土道路建成后，最需要加强哪些方面的维护和管理？（可多选）

- A. 定期检查和维修
- B. 加强水质监测
- C. 保护水源地环境
- D. 防止非法占用道路
- E. 加强安全巡逻
- F. 提高居民环保意识
- G. 其他

10. 您对本项目建设的基础设施整体满意度如何？

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意

“乡村振兴”预算股项目 居民满意度调查问卷-荆山口村

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调查采用了问卷调查法，调查对象涵盖“乡村振兴”预算股项目中的受益群众。

（二）调研内容

针对项目开展情况，从受益群体反馈等方面设计了相关问题，形成调查问卷。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

根据前期查阅部门整体资料，通过线上微信社交平台发放问卷二维码，线下座谈会和入户走访进行面对面的交谈，并结合电话访问的方式全面了解项目受益群体的满意程度及相关意见。

（二）抽样方式

根据提供的受益群众清单的样本分布，科学的进行多段随机抽样，保证最终执行样本的代表性，并保证抽查项目样本不少于统计学上最低统计样本量进行评价。

三、问卷的发放和回收

本次满意度调查采用线上、线下问卷发放及电话访问的方式调查受益群众的满意度，收集受益群众对被评价项目的意见和建议。同时，我们在被访问人员填写问卷时将对问卷的填写

时间进行监控，问卷的填写时间快于经测算的标准时间 50%以上的，我们将采取作废处理。不同方式收集的问卷信息也进行相互验证，确保问卷信息的全面性和可信度。共收集调查问卷 12 份，其中有效问卷 12 份，经汇总统计“乡村振兴”预算股项目受益群众满意度为 86.67%。

四、满意度分析

1. 关于您是否为水库移民本人结果如下：

关于您是否为水库移民本人的调查情况，其中：是的为 1 人，占比 8.33%；否的为 11 人，占比 91.67%。

选项	小计	比例
A.是	1	8.33%
B.否	11	91.67%
本题有效填写人次	12	

2. 您是否清楚关于移民村基础设施建设的的项目？调查结果如下：

关于您是否清楚关于移民村基础设施建设项目的调查情况，其中：完全了解的为 1 人，占比 8.33%；比较了解的为 6 人，占比 50%；知道一些的为 4 人，占比 33.33%；完全不了解的为 1 人，占比 8.33%。

选项	小计	比例
A.完全了解	1	8.33%
B.比较了解	6	50%
C.知道一些	4	33.33%
D.完全不了解	1	8.33%

本题有效填写人次	12	
----------	----	--

3. 您对新铺设的供水 PE 管道的使用满意吗？调查结果如下：

关于您对新铺设的供水 PE 管道的使用调查情况，其中：非常满意的 3 人，占比 25%；满意的 8 人，占比 66.67%；一般的 1 人，占比 8.33%；不满意的 1 人，占比 8.33%。

选项	小计	比例
A.非常满意	3	 25%
B.满意	8	 66.67%
C.一般	1	 8.33%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	12	

4. 您是否遇到过因供水 PE 管道问题导致的断水或水质问题？调查结果如下：

关于您是否遇到过因供水 PE 管道问题导致的断水或水质问题的调查情况，其中：经常遇到的 0 人，占比 0%；偶尔遇到的 5 人，占比 41.67%；从未遇到的 7 人，占比 58.33%。

选项	小计	比例
A.经常遇到	0	 0%
B.偶尔遇到	5	 41.67%
C.从未遇到	7	 58.33%
本题有效填写人次	12	

5. 您对新建饮水水源的水质满意吗？调查结果如下：

关于您对新建饮水水源水质的调查情况，其中：非常满意的 2 人，占比 16.67%；满意的 9 人，占比 75%；一般的 1 人，占比 8.33%；不满意的 0 人，占比 0%。

选项	小计	比例
A.非常满意	2	 16.67%
B.满意	9	 75%
C.一般	1	 8.33%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	12	

6. 通过这些基础设施的建设，您在出行、用水等方面的便利程度是否得到提高？调查结果如下：

关于通过这些基础设施的建设，您在出行、用水等方面的便利程度是否得到提高的调查情况，其中：提高很多的1人，占比8.33%；有所提高的10人，占比83.33%；基本无变化的1人，占比8.33%；变得更差的0人，占比0%。

选项	小计	比例
A.提高很多	1	 8.33%
B.有所提高	10	 83.33%
C.基本无变化	1	 8.33%
D.变得更差	0	 0%
本题有效填写人次	12	

7. 您认为供水PE管道、新建饮水水源和混凝土道路建设对您的日常生活有何影响？调查结果如下：

关于您认为供水PE管道、新建饮水水源和混凝土道路建设对您日常生活影响的调查情况，其中：居住环境更优美的4人，占比33.33%；交通更加便利的8人，占比66.67%；生活用水更安全的9人，占比23.08%；文化娱乐活动增加的4人，占比33.33%；没有明显变化的1人，占比8.33%；其他的1人，占比

8.33%。

选项	小计	比例
A.居住环境更优美	4	 33.33%
B.交通更加便利	8	 66.67%
C.生活用水更安全	9	 75%
D.文化娱乐活动增加	4	 33.33%
E.没有明显变化	1	 8.33%
F.其他	1	 8.33%
本题有效填写人次	12	

8. 您认为项目建成后的设施是否具备长期使用价值和稳定效果？调查结果如下：

关于您认为项目建成后的设施是否具备长期使用价值和稳定效果的调查情况，其中：完全具备的 2 人，占比 16.67%；基本具备的 7 人，占比 58.33%；不确定的 3 人，占比 25%；不具备的 0 人，占比 0%。

选项	小计	比例
A.完全具备	2	 16.67%
B.基本具备	7	 58.33%
C.不确定	3	 25%
D.不具备	0	 0%
本题有效填写人次	12	

9. 您认为供水 PE 管道、新建饮水水源和混凝土道路建成后，最需要加强哪些方面的维护和管理？调查结果如下：

关于您认为供水 PE 管道、新建饮水水源和混凝土道路建成后，最需要加强哪些方面的维护和管理的情况，其中：定

期检查和维修的 6 人，占比 50%；加强水质监测的 6 人，占比 50%；保护水源地环境的 5 人，占比 41.67%；防止非法占用道路的 6 人，占比 50%；加强安全巡逻的 5 人，占比 41.67%；提高居民环保意识的 4 人，占比 33.33%；其他的 1 人，占比 8.33%。

选项	小计	比例
A.定期检查和维修	6	 50%
B.加强水质监测	6	 50%
C.保护水源地环境	5	 41.67%
D.防止非法占用道路	6	 50%
E.加强安全巡逻	5	 41.67%
F.提高居民环保意识	4	 33.33%
G.其他	1	 8.33%
本题有效填写人次	12	

10. 您对本项目建设的基础设施整体满意度如何？调查结果如下：

关于您对本项目建设的基础设施整体满意度的调查情况，其中：非常满意的 2 人，占比 16.67%；满意的 8 人，占比 66.67%；一般的 2 人，占比 16.67%；不满意的 0 人，占比 0%。

选项	小计	比例
A.非常满意	2	 16.67%
B.满意	8	 66.67%
C.一般	2	 16.67%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	12	

附件 3：相关文件、制度

枣庄市市中区财政局文件

市中财农整指〔2022〕31号

关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央 财政补助）预算指标的通知

区城乡水务局：

根据市财政局《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕31号），及区委农办分配方案，现将 2022 年中央财政乡村振兴重大专项资金预算指标 1100 万元下达给你。支出列 2022 年“2082202 基础设施建设和经济发展”支出功能分类科目，主要用于东南村和西街村、峨山口美丽移民村项目、中义和村水生态治理项目、纪官庄村和宋楼村、东花沟村美丽家园项目、前小湾村排涝治理项目、后小湾村和杨楼村、后孟庄村道路硬化项目、荆山口村和沈桥村饮水安全改造项目。

请严格按照有关规定，采取有效措施，加强资金监管，确

枣庄市城乡水务局文件

枣水建字〔2022〕25号

关于做好2022年中央水库移民扶持基金 (清算)使用工作的通知

各区(市)城乡水务局, 枣庄高新区社会事务综合服务中心:

市财政局以《枣庄市财政局关于下达2022年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(枣财农整指〔2022〕32号)下达了2022年中央财政大中型水库移民后期扶持基金(清算)预算指标, 根据《山东省水利厅关于做好2022年中央水库移民扶持基金(清算)使用工作的通知》(鲁水移民函字〔2022〕19号)要求, 现将有关事项通知如下:

2022年中央水库移民扶持基金(清算)为项目资金, 资金已拨付各区(市)。项目资金包括存在问题类移民村、美丽移民村、产业试点项目、基础设施建设和经济发展项目

资金。项目资金主要用于支持库区和移民安置区基础设施及经济社会发展，实施美丽家园建设、产业发展、就业创业能力建设等，优先解决基础设施建设和提高民生保障水平。请各区（市）将项目计划和绩效目标于8月10日前以正式文件报送市局（见附件1至4），产业试点项目实施方案于9月5日前报送市局。请各区（市）、高新区尽快组织实施，确保12月31日前全部完成建设任务（包括竣工验收、资金支付到位和交付使用）。

联系人：杜强，电话：3317410，邮箱：zzslj@163.com

- 附件：1. 2022年大中型水库移民后期扶持基金项目表
2. 2022年大中型水库移民后期扶持基金项目汇总表1
3. 2022年大中型水库移民后期扶持基金项目汇总表2
4. 2022年大中型水库移民扶持基金绩效目标申报表
5. 山东省水利厅关于做好2022年中央水库移民扶持基金（清算）使用工作的通知



枣庄市财政局文件

枣财农整指〔2022〕31号

关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金 (中央财政补助) 预算指标的通知

各区(市)财政局、高新区财政金融局:

为提高预算完整性,加快支出进度,根据《山东省财政厅关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(鲁财农整指〔2022〕24号)、《关于 2022 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的分配建议》(枣水财审字〔2022〕18号)和我省涉农资金统筹整合有关要求,经研究,现下达 2022 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标。

中央水库移民扶持基金(项目代码:Z165070000003),支出列 2022 年“2082202 基础设施建设和经济发展”预算科目,用于美丽移民村建设、基础设施建设、后进移民村帮扶等,支持移民安置区经济社会发展,具体金额见附件 1。请按照省财政厅、省

附件1:

2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标分配表

金额单位：万元

区（市）	合计	存在问题移民村	美丽移民村建设	产业试点项目	基础设施建设和经济发展项目	备注
滕州市	2100		1200	600	300	
薛城区	250				250	
山亭区	1050	50	400	600		
市中区	1100	300	600		200	
峯城区	400		200		200	
台儿庄区	96				96	
高新区	50				50	
合计	5046	350	2400	1200	1096	



枣庄市市中区城乡水务局文件

市中水字（2022）60号

签发人：刘绍强

关于市中区 2022 年水库移民扶持基金 （清算）项目计划的请示

枣庄市城乡水务局：

根据山东省水利厅鲁水移民函字[2022]19号《关于做好2022年中央水库移民扶持基金（清算）使用工作的通知》及枣庄市城乡水务局枣水建字[2022]25号文件的有关要求，我区共申请2022年水库移民扶持基金（清算）项目1100万元，涉及3个镇13个村13个项目，主要建设内容为美丽移民村建设、水生态治理、饮水安全提升改造等。项目实施后将会大大改善居民生活环境，受益群众为14693人，其中移民人口为465人。

当否，请批示。

枣庄市市中区城乡水务局

2022年8月10日

附件2

2022年中央水库移民扶持基金项目表

序号	县(市)	乡镇	村庄	扶持资金(万元)	项目名称	备注
市合计						
1	市中区	税郭镇	东南村	200	东南村美丽移民村项目	√
2	市中区	税郭镇	中义和村	80	中义和村水生态治理项目	√
3	市中区	税郭镇	纪官庄	35	纪官庄村美丽家园项目	√
4	市中区	西王庄镇	西街村	200	西街村美丽移民村项目	√
5	市中区	西王庄镇	前小湾村	50	前小湾村排涝治理项目	√
6	市中区	西王庄镇	后小湾村	50	后小湾村道路硬化项目	√
7	市中区	西王庄镇	杨楼村	50	杨楼村道路硬化项目	√
8	市中区	西王庄镇	宋楼村	50	宋楼村美丽家园项目	√
9	市中区	西王庄镇	东花沟村	35	东花沟村美丽家园项目	√
10	市中区	孟庄镇	峨山口村	200	峨山口美丽移民村项目	√
11	市中区	孟庄镇	荆山口村	50	荆山口村饮水安全改造项目	√
12	市中区	孟庄镇	沈桥村	50	沈桥村饮水安全改造项目	
13	市中区	孟庄镇	后孟庄	50	后孟庄村道路硬化项目	
	...					
...	...					
				1100		

注：请在项目备注中写明省级安排的“三类村”“美丽移民村”“产业试点项目”。

附件2
转移支付区域（2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目）绩效目标自评表
 （2022年度）

转移支付（项目）名称		市中区2022年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）		
	年度资金总额：	1100				
	其中：中央财政资金	1100				
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成东花沟村、纪官庄村、宋楼村美丽家园项目；孟庄村、后小湾村、杨楼村道路硬化项目；荆山口村、沈桥村饮水安全项目；中义和村水生态治理项目；前小湾村排涝治理项目		完成东花沟村、纪官庄村、宋楼村美丽家园项目；孟庄村、后小湾村、杨楼村道路硬化项目；荆山口村、沈桥村饮水安全项目；中义和村水生态治理项目；前小湾村排涝治理项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成美丽家园	10	10	
			建成美丽移民村项目	3	3	
		质量指标	质量合格	合格	合格	
			2022年完成100%	完成	完成	
		成本指标	控制在预算内	满足	满足	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目良性运行比例	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100.00%	100.00%	
			交办的信访事项及时处理率（%）	100.00%	100.00%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如无请填写。
 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

枣庄市市中区城乡水



关于申请使用 2022 年大中型水库移民直补 结余资金的函

区财政局：

根据《山东省水利厅 财政厅关于进一步加强水库移民资金管理工作的通知》要求，我区 2022 年移民直补结余资金 57 万元，现申请该资金用于光明路街道东龙头社区美丽家园项目，主要建设内容为道路硬化 1160 米，修建排水沟 2320 米。项目实施后，提升社区基础设施建设，改善居民生活环境，受益群众 2400 人。

枣庄市市中区城乡水局

2022年9月12日



枣庄市城乡水务局文件



枣水建字〔2022〕37号

关于市中区 2022 年大中型水库移民直补结余 资金项目计划的批复

市中区城乡水务局：

你局上报的《关于申请 2022 年大中型水库移民直补结余资金项目计划的请示》（市中水字〔2022〕74 号）已收悉，经研究，现批复你区大中型水库移民直补结余资金东龙头社区美丽家园项目计划，总投资 57 万元。

请按照《加强大中型水库移民后期扶持人口自然变化管理的指导意见》（鲁水移领字〔2008〕1 号）、《关于加强水利移民扶持项目建设管理的指导意见》（鲁水移字〔2013〕31 号）、《关于进一步推进移民扶持项目建设规范化管理工作的通知》（鲁水移字〔2016〕37 号）、《关于进一步加强水库移民资金管理工作的通知》（鲁水移民字〔2017〕4 号）、《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》（财农



枣庄市市中区城乡水务局文件



市中水字（2022）74号

签发人：刘绍强

关于申请 2022 年大中型水库移民直补结余 资金项目计划的请示

枣庄市城乡水务局：

根据《山东省水利厅 财政厅关于进一步加强水库移民资金管理工作的通知》要求，我区 2022 年移民直补结余资金 57 万元，现申请该资金用于光明路街道东龙头社区美丽家园项目，主要建设内容为道路硬化 1160 米，修建排水沟 2320 米。项目实施后，提升社区基础设施建设，改善居民生活环境，受益群众 2400 人。

当否，请批示。

附件：2022 年大中型水库移民直补结余资金项目表

枣庄市市中区城乡水务局

2022 年 9 月 9 日



市中区城乡水务局

会议纪要



枣市中水务纪字〔2023〕6号

2023年2月23日，刘绍强局长在局207会议室主持召开办公会议，现纪要如下：

一、传达会议精神

2月21日，市中区党政联席会议暨“我就是市中”主题大讨论活动会议精神。

二、研究议题

(一)关于枣庄学院未经批准擅自取水案减免加处罚款及推送税务部门有关信息的讨论

基本情况：关于枣庄学院未经批准擅自取水案，我局于2022年9月15日对其下达《行政处罚决定书》，罚款玖万元，要求15日内缴纳罚款，逾期不交的，每日按罚款金额的3%加处罚款。枣庄学院9月20日向市中区人民政府提出行政复议，我局于9月26日收到《提出行政复议答复通知书》，并于9月28日作出《行政复议答复书》。因疫情防控特殊时期，中止受理行政复议，于12月14日下达行政复议决定书维持原决定。我局于2023年1月3日对枣庄学院下达催交罚款通知书，学院张主任表示，学院放假及部分领

市中区城乡水务局

会议纪要



枣市中水务纪字〔2023〕2号

2023年1月17日，区城乡水务局局长刘绍强主持召开了局长办公会，就部分工程申请拨付工程款进行研究，纪要如下：

1、柏山水库除险加固工程，现申请支付款项25.5万元，资金来源枣财农整指〔2022〕9号文省级财政补助57万元。

2、2022年大中型水库移民后期扶持资金项目（第一批），现申请支付款项81.49万元，资金来源枣财农整指〔2022〕1号文中央财政补助895万元。

3、2022年大中型水库移民扶持基金（清算）（第二批），现申请款项115.01万元，资金来源枣财农整指〔2022〕31号文中央财政补助1100万元。

4、2022年小型水库维修养护及日常管护费，现申请款项10万元，资金来源2022年区级资金小水库水管体制改革管护经费19万元。

5、2022年农村饮水工程，现申请款项60万元，资金来源枣财农整指〔2021〕15号文市级财政补助150万元。



枣庄市市中区城乡水务局 财务管理办法

为加强全局的财务、财产管理，理顺财务、财产管理体制，更好地规范各项财务收支和财产使用行为，提高资金、财产的使用效益，根据有关法律法规，结合我局实际，制定本制度。

一、基本原则

(一) 严格执行国家、省、市有关财务法律、法规规定，本着勤俭节约的原则，合理使用资金；按照会计制度的要求，正确处理事业发展与经费供给关系，坚持财务公开，完善财务监督。

(二) 财务实行统收统支集中管理，负责全局的财务工作。

(三) 坚持先批准后支出原则，对未经批准的开支，财务人员不予报销。

(四) 财务股统一与财政（或上级主管机关）办理经费拨付及年度部门预决算的编制等工作。

二、预算管理

经费实行预算管理，凡有定额标准的经费项目均按定额确定预算标准，没有定额标准的经费项目参照历史水平确定预算指标。各股室每年于11月底前编报年度支出预算，按下列规定报责任股室审核、汇总，编制初步预算报财务股：

(一) 工资、补助工资及其他工资性支出预算，由人事股负责。

(二) 通讯费、水电费、修缮费、办公用品及车辆的有关支出预算由办公室负责。

(三) 邮寄费、会议费、印刷费的支出预算由各股室编报办公室审核、汇总，确定年度支出预算。

市中区 2022 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金 项目工程质量验收管理制度

1、质量控制机构

现场工程部作为法人派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位（分包单位）、材料、设备供应商严格履约实现质量目标。

2、事前控制

- 2.1 根据工程特点、质量目标编制《工程指导书》，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。
- 2.2 根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查《监理规划》，以便监督监理质量管理行为。
- 2.3 根据合同要求，现场工程部和监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。
- 2.4 督促监理单位认真审核施工单位报验资料，严把施工单位材料进场关，确保无不合格材料进场。

3、过程监控

- 3.1 测量及定位放线的监控
- 3.2 重要材料、设备的质量监控
- 3.3 对隐蔽工程及重要和关键工序的监控

质量检查制度

一、开工前检查内容有：

1. 图纸会审是否满足施工需要。
2. 技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成。
3. 采用新技术、新工艺、新设备，已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用
4. 施工准备是否具备开工条件
5. 创优目标、质量措施是否制定。
6. 原材料实验是否完成，并且合格。

二、施工过程中检查的内容有：

1. 是否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。
2. 施工测量：放样是否经过复核无误。是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性
3. 施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。
4. 原始记录是否完善，记载是否详实。
5. 是否按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。
6. 是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。
7. 配料计量是否准确。

附件 4、项目现场调查照片









附件 5、其他

副 本

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金(清算)
项目施工一标



合同编号: ZZSZSKYMQS-2022-SG01

发 包 人: 枣庄市市中区城乡水务局

枣庄市市中区水利水电工程移民工作领导小组办公室

承 包 人: 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司

签订日期: 2022 年 11 月 7 日

副 本

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金(清算)

项目施工二标



合
同

合同编号：ZZSZSKYMQS-2022-SG02

发 包 人：枣庄市市中区城乡水务局

枣庄市市中区水利水电工程移民工作领导小组办公室

承 包 人：山东鸿运水利工程有限公司

签订日期：2022 年 11 月 7 日

副 本

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金(清算)

项目施工三标



合

同

合同编号：ZZSZSKYMQS-2022-SG03

发 包 人：枣庄市市中区城乡水务局

枣庄市市中区水利水电工程移民工作领导小组办公室

承 包 人：枣庄市水利开发有限公司

签订日期：2022 年 11 月 7 日

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目施工一标







山东尚立[2023]审字第039号

山东尚立工程项目管理有限公司



2023年06月14日

工程造价审核定案表

工程名称	枣庄市市中区 2022 年中央水库 移民后期扶持基金（清算）项 目施工一标	建筑面积	
开工日期		竣工日期	
咨 询 结 果			
送审工程造价（元）	3781556.83		
审定工程造价（元）	3713756.11		
净审减、增值（元）	67800.72		
其中：审增值（元）	/		
审减值（元）	67800.72		
建设单位	施工单位	咨询单位	
（公章）	（公章）	中华人民共和国注册造价工程师 编号：B14203700000981 山东尚立工程项目管理有限公司 有效期至：2024年07月27日 	
 办公室	 经办人：彭燕燕	复核 中华人民共和国注册造价工程师 编号：B11203700000065 山东尚立工程项目管理有限公司 有效期至：2024年04月23日 	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	

市中区

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目施工二标

结 算 审 计

山东尚立[2023]审字第 040 号



山东尚立工程项目管理有限公司



2023 年 06 月 14 日



枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目施工三标

结 算 审 计

山东尚立[2023]审字第 041 号



山东尚立工程项目管理有限公司



2023 年 06 月 14 日



枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目
竣工验收

鉴定书

（一）工程名称及性质

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目
验收委员会

2023 年 3 月 31 日

340222

报告编号	2022-SZYMQS02-1R001
报告页数	1

检 验 报 告

Test Report

样品名称 混凝土抗压试块
Sample Name


委托单位 枣庄市市中区城乡水务局
枣庄市市中区水利水电工程移民
工作领导小组办公室
Client

工程名称 枣庄市市中区 2022 年中央水库
移民后期扶持基金（清算）项目 2 标
Project Name

检测类别 抽样检验
Classification of Test

中国国检测试控股集团山东有限公司
China Testing & Certification International Group Shandong Co., Ltd.

本证书表明持证人具
备担任相应专业技术职务
的任职资格。



持证人签名: _____

姓 名: 魏改理
性 别: 男
出生年月: 1965.08
工作单位: 枣庄市市中区城乡水务局
现从事专业: 建筑材料
原专业技术职务名称: 助理工程师
现专业技术职务名称: 工程师
身份证号: 370402196508150011
证书编号: 鲁 1700185

评审委员会(章)

评审时间: 2017 年 11 月 24 日
公布时间: 2017 年 12 月 15 日
(生效时间)
公布文号: 鲁人社办发【2011】219 号

7.3 抽样检测报告

中国国检测试控股集团山东有限公司
普通硅酸盐水泥检测报告
第 2 页 第 1 页

委托单位	枣庄市市中区城乡水务局 枣庄市市中区水利水电工程移民工 程领导小组办公室	报告编号	2022-SZYMQS01-SN001
工程名称	枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目 1 标		
工程部位	混凝土工程	样品名称	普通硅酸盐水泥
样品数量	50kg	样品状态	粉状、干燥、无结块
代表批量	/	等级规格	P.O 42.5
抽样日期	2022 年 11 月 11 日	检验日期	2022 年 11 月 13 日
生产厂家	中联	见证单位	山东鸿禹工程监理咨询有限公司
见证人	孙静	检测类别	抽样检测
检测地点	水泥物珍室	环境条件	温度 20℃
检测项目	凝结时间、标准稠度用水量、安定性、细度、抗折强度、抗压强度		
检测依据	《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011)、《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》(GB/TS074-2008)		
检测结论	依据标准 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》，所检项目符合标准要求。		
备注	抽样检验仅对抽样样品负责		

批准: _____ 审核: _____ 主检: _____
检测单位: 中国国检测试控股集团山东有限公司
日期: 2022 年 12 月 13 日

502340222

报告编号	2022-SZYMQS01-SN001
报告页数	2

检 验 报 告

Test Report

样品名称 普通硅酸盐水泥
Sample Name

委托单位 枣庄市市中区城乡水务局
枣庄市市中区水利水电工程移民
工作领导小组办公室
Client

工程名称 枣庄市市中区 2022 年中央水库
移民后期扶持基金（清算）项目 1 标
Project Name

检测类别 抽样检验
Classification of Test

中国国检测试控股集团山东有限公司
China Testing & Certification International Group Shandong Co., Ltd.

中国国恒测试控股集团山东有限公司

水工混凝土细骨料检测报告附页

共2页 第2页

检测项目	技术指标		检测结果	单项判定					
含泥量 (%)	$\geq C_{90}30$ 和有抗冻要求的	≤ 3	2.4	合格					
	$< C_{90}30$	≤ 5	/	/					
泥块含量 (%)	不允许		0	合格					
石粉含量 (%) (人工砂)	6~18		/	/					
表观密度 (kg/m^3)	≥ 2500		2700	合格					
堆积密度 (kg/m^3)	/		1480	实测值					
空隙率 (%)	≤ 44		/	/					
轻物质含量 (%)	≤ 1		/	/					
表面含水率 (%)	≤ 6		/	/					
颗 粒 级 配									
筛孔尺寸 (mm)	10.0	5.0	2.5	1.25	0.63	0.315	0.16	检测结果	
砂颗粒级配区	I区	0	10~0	35~5	65~35	85~71	95~80	100~90	细度模数
	II区	0	10~0	25~0	50~10	70~41	92~70	100~90	2.9
	III区	0	10~0	15~0	25~0	40~16	85~55	100~90	级配区属
实际累计筛余 (%)	/	2	15	33	63	88	97	II区	

CB36

报告单

(山东鸿运[2023]报告 002 号)

合同名称: 枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目施工二标
合同编号: ZZSZSKYMQS-2022-SG02



报告事由:

结合村民诉求, 村委两委要求牌坊材料为青石并且增加浮雕, 材料以及造型比图纸样式更为复杂, 由于市场价高于清单价格, 需要调高清单价格(约增加 4 万元, 后附考察报告)。

特此申请。
请批示。

承包 人: 山东鸿运水利工程有限公司
市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目项目经理部
项目经理:
日 期: 2023 年 1 月 12 日



监理机构意见:

监 理 机 构: 山东鸿禹工程监理咨询有限公司
市中区项目监理部
总监理工程师:
日 期: 2023 年 1 月 12 日



设计机构意见:

设 计 单 位: 枣庄市水利勘测设计院
设 计 代 表:
日 期: 2023 年 1 月 12 日



发包人意见:

1. 2. 3.

发 包 人: 枣庄市市中区城乡水务局
枣庄市市中区水利水电工程移民工作领导小组办公室
负 责 人:
日 期: 2023 年 1 月 12 日



说明: 1. 本表一式 3 份, 由承包人填写, 监理机构、发包人签署意见后, 发包人 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

在 在

2022 年中央水库移民扶持基金（清算）项目

市中区税郭镇东南村美丽移民村项目

实施方案

（送审稿）



编制单位：枣庄市水利勘测设计院

证书编号：A137019333

编制日期：二〇二二年九月

2022年中央水库移民扶持基金绩效目标申报表

(2022年度)

专项名称		大中型水库移民后期扶持资金(含政府性基金和一般公共预算安排部分)			
省份					
市级财政部门					
市级主管部门					
资金情况 (万元)	年度总额:	1100			
	其中:中央水库移民扶持基金	1100万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设1100万元、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……)			
	地方水库移民扶持基金	万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……)			
	其他资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……)			
年度目标	目标1: 目标2: 目标3: ……(根据预算安排情况补充完善,分条描述项目的主要产出和效果,定性描述和定量描述相结合)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	指标1:后期扶持受益移民人口(人)	465
				指标2:避险解困移民(人)	/
				指标3:移民美丽家园项目(个)	13
				指标4:生产开发及配套基础设施项目(个)	/
		指标5:培训移民劳动力(人次)		/	
		产出指标	指标1:培训合格率(%)	/	
			指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%)	100%	
			……		
			指标3:直补资金按时发放率(%)	/	
	时效指标		指标2:截至当年底,项目资金完成率(%)	80%	
	成本指标	指标2:截至次3月底,项目资金完成率(%)	100%		
		……			
		指标1:直补资金标准符合率(%)	/		
		指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%		
		……			
	二级指标	经济效益	指标1:增加移民人均可支配收入(元)	/	
			指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	/	
		社会效益	指标1:助力贫困移民脱贫(人)	/	
			指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	/	
……					
生态效益	指标1:建成美丽移民村(个)	3			
	指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	10			
三级指标	服务对象满意度	指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%		
		指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	0		
		指标3:交办的信访事项及时处理率(%)	100%		
	……				

注:1、本表填报的资金范围包括政府性基金和一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金,各市应于收到两项资金以后合并填报绩效目标申报表;
2、600元直补资金中除用于直接发放给移民个人的外,剩余的资金(含人口自然变化产生的资金)都应填到相应项目中。



附件 3

山东省枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

枣庄市财政局以枣财农整指（2022）31 号下达中央水库财政资金 1100 万元，专项用于 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目批复投资 1100 万元，全年执行资金 1100 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

上级分配市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目中央资金 1100 万元，下达资金 1100 万元，拨付资金 215.01 万元，资金均用于市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目，资金使用合理，执行准确，预算绩效管理规范，支出责任履行规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

目标：完成东花沟村、纪官庄村、宋楼村美丽家园项目；孟庄村、后小湾村、杨楼村道路硬化项目；荆山口村、沈桥村饮水安全项目；中义和村水生态治理项目；前小湾村排涝治理项目

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：建成美丽家园项目 10 个、美丽移民村项目 1

转移支付区域（2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目）绩效目标自
 述
 （2022年度）

转移支付（项目）名称		市中区2022年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目				
地方主管部门		枣庄市城乡水务局		资金使用单位	枣庄市市中区水务局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额：	1100	466.58	42.42%		
	其中：中央财政资金	1100	466.58	42.42%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合格				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	管理合理				
	支出责任履行情况	支出及时				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成东花沟村、纪官庄村、宋楼村美丽家园项目；孟庄村、后小湾村、杨楼村道路硬化项目；荆山口村、沈桥村饮水安全项目；中义和村水生态治理项目；前小湾村排涝治理项目			完成东花沟村、纪官庄村、宋楼村美丽家园项目；孟庄村、后小湾村、杨楼村道路硬化项目；荆山口村、沈桥村饮水安全项目；中义和村水生态治理项目；前小湾村排涝治理项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成美丽家园	10	10	完成
			建成美丽移民村项目	3	3	完成
		质量指标	质量合格	合格	合格	完成
		时效指标	2022年完成100%	完成	完成	完成
		成本指标	控制预算内	满足	满足	完成
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	创收	创收	完成
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平	增加	增加	完成
		生态效益指标	建成美丽移民村	10	10	完成
		可持续影响指标	项目良性运行比例	100.00%	100.00%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100.00%	100.00%	完成
		满意度指标	交办的信访事项及时处理率（%）	100.00%	100.00%	完成

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持资金
项目的说明



枣庄市市中区城乡水务局：

山东鸿运水利工程有限公司（以下简称“鸿运公司”）
中标枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持资金项目
工程，现委托“山东鸿运水利工程有限公司市中分公司”为
主体实施该项目。授权“山东鸿运水利工程有限公司市中分公司”开
具发票、收取工程款项，相关税金缴纳至枣庄市市中区国家
税务局。由此产生的经济纠纷由鸿运公司及分公司共同承
担。

山东鸿运水利工程有限公司

2024.09.06



扫描全能王 创建

枣庄市市中区 2022 年 中央水库移民后期扶持基金（清算）项目 竣工财务决算审计报告

鲁泰信会枣专审字[2023]第 026 号

枣庄市市中区水利水电工程移民工作领导小组办公室：

我们接受委托，对截至 2023 年 6 月 21 日的枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目竣工财务决算进行了审计。按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，合理编制竣工财务决算，保证相关资料的真实、合法、完整，是枣庄市市中区水利水电工程移民工作领导小组办公室（以下简称市中区移民办）和枣庄市市中区城乡水务局的责任。我们的责任是根据相关文件规定，在实施审计工作的基础上，出具竣工决算审计报告，发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合该项目实际情况，实施了包括听取情况介绍、查阅项目管理和财政拨款相关文件、审核资金账目、审查资金收支凭证、查阅相关档案资料等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。现将审计情况报告如下：

一、项目概况

枣庄市市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目计划，由枣庄市城乡水务局于 2022 年 8 月 12 日以枣水建字[2022]28 号文件下达。该项目实施方案，由枣庄市水利勘测





记账凭证

2028 1月 3日

凭证字 记[财务]
凭证号: 0033

创建
扫描全能王

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款	1613-48-01-01	在建工程-2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目-建筑安装工程投资-建筑投资	500,000.00	
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款	1011	零余额账户用款额度		500,000.00
合计	伍拾万元整		¥500,000.00	¥500,000.00

附件 25 张

会计主管: 记账: 复核: 制单: 颜娇 出纳:



记账凭证

2028 1月 3日

凭证字 记[预算]
凭证号: 0033

创建
扫描全能王

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款	2201-01-02	基金支出-移民后期扶持基金-项目工程款-2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目-1310-02 基础设施投资-2022 移民后期扶持基金	500,000.00	
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款	8001-02	资金结存-零余额账户用款额度		500,000.00
合计	伍拾万元整		¥500,000.00	¥500,000.00

附件 25 张

会计主管: 记账: 复核: 制单: 颜娇 出纳:

国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

业务类型：普通业务

结算方式：电子转账支付

日期：2023年01月18日

支票号：

编号：DP2023011800790

资金性质：预算管理资金

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区城乡水务局	收款人	全称	陕西盛鑫建筑安装工程有限公司
	账号	37001646108058020181		账号	26415301040006638
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	中国农业银行武功县支行营业部
一级预算单位	枣庄市市中区城乡水务局		功能科目	2082202 基础设施建设和经济发展	
基层预算单位	枣庄市市中区城乡水务局本级		备注	工程款	
金额	人民币（大写）： 伍拾万元整			人民币（小写）： ¥500,000.00	
			代理银行（公章）： 		

第 1 次打印

扫描全能王 创建

记账凭证

2023 年 1 月 3 日

凭证字 记[财务]
凭证号： 0031

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
付2022年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目	1613-48-01-01	在建工程-2022年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目-建筑安装工程投资-建筑投资	300,000.00	
付2022年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目	1011	零余额账户用款额度		300,000.00
合计	叁拾万元整		¥300,000.00	¥300,000.00

会计主管：

记账：

复核：

制单：

颜娇

出纳：

附件 29 张

扫描全能王 创建

记 账 凭 证

2023 1月 3日

凭证字 记[预算]
凭证号: 0031

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目	7201-01-02 事业支出-财政拨入支出-政府性基金预算项目102-04 2022年中央水库移民扶持基金(清算)项目1310-04 基础设施建设项目22-02 基础设施建设和经济		300,000.00	
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目	8001-02 资金结存-零余额账户用款额度			300,000.00
合 计	叁拾万元整		¥300,000.00	¥300,000.00


会计主管: 记账: 复核: 制单: 颜娇 出纳:

扫描全能王 创建

附件 29 张

国库集中支付凭证

日期: 2023年01月18日 编 号: DP2023011800777
 类型: 普通业务 资金性质: 预算管理资金
 结算方式: 电子转账支付 支票号: 金额单位: 元

付款人	全称	枣庄市市中区城乡水务局	收款人	全称	山东鸿运水利工程有限公司市中分公司
	账号	37001646108058020181		账号	808061001421006452
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市支行		开户行	枣庄银行股份有限公司青檀路支行
一级预算单位		枣庄市市中区城乡水务局	功能科目		2082202 基础设施建设和经济发展
基层预算单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	备 注		2022年中央水库移民后期扶持基金项目工程款
金额 人民币(大写): 叁拾万元整			人民币(小写): ¥300,000.00		
 2023-01-18 17:13:27			代理银行 (公章):  2023-01-18 18:36:03		

扫描全能王 创建

创建
扫描全能王

山东增值税普通发票

No 09627075

037001900304
09627075

校验码 72982 26129 13912 65520

开票日期: 2023年01月17日

购买方	名称: 枣庄市市中区城乡水务局 纳税人识别号: 11370402004248169W 地址、电话: 开户行及账号:	密码区	0>+9/*+694**22-78*9<36*504- 9>0231<650<+8372+>13--446/+ 8>/35>0*-98<65*12+25-<>2610 7443//22-1<2506+*2532>852>*																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>货物或应税劳务、服务名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> <th>税率</th> <th>税额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*建筑服务*工程款</td> <td></td> <td>次</td> <td></td> <td>275229.3578</td> <td>275229.36</td> <td>9%</td> <td>24770.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥275229.36</td> <td></td> <td>¥24770.6</td> </tr> </tbody> </table>	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	*建筑服务*工程款		次		275229.3578	275229.36	9%	24770.6	合 计					¥275229.36		¥24770.6		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额																				
*建筑服务*工程款		次		275229.3578	275229.36	9%	24770.6																				
合 计					¥275229.36		¥24770.6																				
价税合计(大写)		叁拾万圆整		(小写)		¥300000.00																					
销售方	名称: 山东鸿运水利工程有限公司市中分公司 纳税人识别号: 91370402MA3RN9CG4Q 地址、电话: 山东省枣庄市市中区光明路尚景五金机电城院内 0632-827116 开户行及账号: 枣庄银行股份有限公司曹州路支行809061001421000452	备注	项目名称: 枣庄市市中区持基金(清算)项目 项目地址: 枣庄市市中区																								

收款人: 王伟 复核: 樊艳慧 开票人: 刘康 销售方: 发票专用章

第二联: 发票联 购买方记账凭证

记账凭证

2023 1月 3日

凭证字 记[财务]
凭证号: 0032

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款	1613-48-01-01	在建工程-2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目-建筑安装工程投资-建筑投资	300,000.00	
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款	1011	零余额账户用款额度		300,000.00
合 计		叁拾万元整	¥300,000.00	¥300,000.00

附件 69 张

记账: 复核: 制单: 颜娇 出纳:

创建
扫描全能王



记账凭证

2023 1月 3日

凭证字 记[预算]
凭证号: 0032

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款	7201-01-02 基金支出-行政事业单位-专项性基金预算项目-2022-01 2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目	8001-02 资金结存-零余额账户用款额度	300,000.00	
付2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目工程款				300,000.00
合计		叁拾万元整	¥300,000.00	¥300,000.00

附件 69 张

会计主管: 记账: 复核: 制单: 颜娇 出纳:

扫描全能王 创建



国库集中支付凭证

预算类型: 当年预算

业务类型: 普通业务

结算方式: 电子转账支付

日期: 2023年01月18日

支票号:

编号: DP2023011800778

资金性质: 预算管理资金

金额单位: 元

付款人	全称	枣庄市市中区城乡水务局	收款人	全称	枣庄市水利开发有限公司
	账号	37001646108058020181		账号	808060801421007256
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市支行		开户行	枣庄银行开发区支行营业室
一级预算单位	枣庄市市中区城乡水务局		功能科目	2082202 基础设施建设和经济发展	
基层预算单位	枣庄市市中区城乡水务局本级		备注	2022年中央水库移民后期扶持基金项目工程款	
金额	人民币(大写): 叁拾万元整			人民币(小写): ¥300,000.00	
 2023-01-16 17:13:32			代理银行(公章):  2023-01-18 13:36:03		

第 1 次打印

扫描全能王 创建





037002100104

山东增值税普通发票



No 65894852

037002100104
65894852

校验码 57860 85682 18585 00759


开票日期: 2023年01月17日

发票号码 [2020] 217号 山东多利达印务有限公司

名称: 枣庄市市中区城乡水务局	纳税人识别号: 11370402004248169W	地址、电话:	开户行及账号:	密码区: 73830/<>*+389/*8-+2>>48-3+*04*-41*-1->45-92<8++2-6436-2-/2912568*73-359/49>-3>311+3<826<-*1>1-741+-3683*-*			
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额 275229.36	税率 9%	税额 24770.64
合计					¥275229.36		¥24770.64
价税合计(大写)		叁拾万圆整		(小写) ¥300000.00			
名称: 枣庄市水利开发有限公司	纳税人识别号: 91370400164457912P	地址、电话: 枣庄市市中区青檀南路71号 0632-5129959	开户行及账号: 枣庄银行开发区支行营业室808060801421007256	备注: 施工地点: 枣庄市市中区 项目名称: 枣庄市市中区2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目施工三标			
收款人: 提彬彬	复核: 王靖	开票人: 提彬彬	销售方: (章) 发票专用章	31370400164457912P			

第二联: 发票联 购买方记账凭证

扫描全能王 创建



记账凭证

2024年 10月 19日

凭证字: 记[财务]
凭证号: 0006

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目3标工程款	2302 应付账款	2302-057 枣庄市水利开发有限公司-2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目	2,515,751.90	
2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目3标工程款	401-01 财政补助收入	401-01-01 政府性基金补助收入-02-99 2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目3标工程款		2,515,751.90
合计	贰佰伍拾壹万伍仟柒佰伍拾壹元玖角整		¥2,515,751.90	¥2,515,751.90

会计主管: 记账: 复核: 制单: 吕艳 出纳:

附件 2张





记账凭证

2024年10月19日

凭证字：记[预算]

凭证号：0006

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目3标工程款	6301.02 财政直接支付收入	政府性基金预算收入102-10 2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目3标工程款		2,515,751.90
2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目3标工程款	7701.01 其他支出	其他支出101-01 2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目3标工程款	2,515,751.90	
合计			¥2,515,751.90	¥2,515,751.90

附件 2张

会计主管： 记账： 复核： 制单： 吕艳 出纳：



国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

业务类型：普通业务

结算方式：电子转账支付

日期：2024年10月11日

支票号：

编号：04025214-502001-0

资金性质：预算管理资金

金额单位：元

付款人	全称：枣庄市市中区城乡水务局 账号：37001646108058020181 开户行：中国建设银行股份有限公司枣庄市支行	收款人	全称：枣庄市水利开发有限公司 账号：808060801421007256 开户行：枣庄银行开发区支行营业部
一级预算单位	枣庄市市中区城乡水务局	功能科目	2137202 基础设施建设和经济发展
基层预算单位	枣庄市市中区城乡水务局本级	备注	2022年移民工程款
金额	人民币(大写)：贰佰伍拾壹万伍仟柒佰伍拾壹元玖角整	人民币(小写)：	¥2,515,751.90
公章：  2024-10-11 15:48:59	审核人：  2024-10-11 15:48:05	代理银行 (公章)：  2024-10-11 16:03:41	

第 1 次打印



收 据

2024/10/11

日期：2024 年 10 月 11 日

No SZC000078

交款单位 枣庄市市中区城乡水务局

收款方式 转账

人民币（大写） 贰佰伍拾壹万伍仟柒佰伍拾壹元玖角零分

¥ 2515751.90

收款事由 市中区 2022 年中央水库移民后期扶持基金（清算）项目 3 标工程款

第一联
收据



单位盖章

财务主管

出纳

经办

备注：实际收款以银行到账为准

